




"मध्यपहाडी व्यापारिक तथा पर्यटकीय शहर
सुन्दर सम्पुर्ण सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

फोन नं. ०६८-५२०९३९ /
५२०२३९ / ५२०३०६
फ्याक्स नं. ०६८-५२०९३९

बागलुङ नगरपालिका कार्यालय



प. सं.:- ०७२/०७३ (योजना)


च.नं.:- ३१६

मिति :- २०७२/०८/०७

विषय :- प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकाबाट २०७२ साल श्रावण देखि २०७२ कात्तिक महिनामा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन नगरपालिका अनुदान संचालन कार्यविधि २०६७ को दफा ३० (१) बमोजिम निर्दिष्ट गरिएको ढाँचामा भरी पाना ८ (आठ) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।


कार्यकारी अधिकृत

(युवराज अधिकारी)
कार्यकारी अधिकृत

०८/०८/२०७२

अनुसूची १३ (क)

कार्यवाहको दफा ३० (१) सँग सम्बन्धित

कार्तिक महिनाको मासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

बागलुङ नगरपालिकाको कार्यालय बागलुङ ।

आ.व ०७२/०७३									
क्र.सं	श्रेणी	कार्तिक महिनाको मासिक अवधिको विवरण			कार्तिक महिनाको मासिक अवधिको बच			दाँकी	
		चालु	पूर्वगत	जम्मा	चालु	पूर्वगत	जम्मा	चालु	पूर्वगत
क)	केन्द्रीय अनुदान								
१	विधार्त अनुदान	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१६८५.८७	१६८५.८७	०.०००	-१६८५.८७
२	सर्वार्त अनुदान, विकास शृङ्ख	०.०००	०.०००	०.०००	१८६४.००	०.०००	१८६४.००	-१८६४.००	०.०००
३	आयोजना, कार्यक्रम बजेट	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	७२.०००	७२.०००	०.०००	-७२.०००
४	अन्य	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००
५	जम्मा	०.०००	०.०००	०.०००	१८६४.००	२४०५.८७	४२६४.८७	-१८६४.००	-२४०५.८७
ख)	संस्थागत प्राप्त								
६	अनुदान	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००
७	कार्यक्रम	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००
८	जम्मा	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००
ग)	आन्तरिक आय								
९	(कर, दस्तुर, शुल्क, विक्री	३८११०९	०.०००	३८११०९	१४६८६२९	०.०००	१४६८६२९	-१०८७४२०	०.०००
१०	राजस्व बाँडफाँड	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१५५३७	१५५३७	०.०००	-१५५३७
११	निम्नकोटी करी आएको	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००
१२	अन्य	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	२९.०००	२९.०००	०.०००	-२९.०००
१३	जम्मा	३८११०९	०.०००	३८११०९	१४६८६२९	४४५३७	१४९३१६६	-१०८७४२०	-४४५३७
१४	कुल जम्मा (५+८+१३)	३८११०९	०.०००	३८११०९	१४६४०२९	२८५१२४	१९४९०४३	-१२७३९२०	-२८५१२४

लेखापाल



कार्यकारी अधिकृत

कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १३ (ख)

कार्यविधिको ३० (१) सग सम्बन्धित

प्रथम चौमसिक भौतिक एवं प्रगति प्रतिवेदन

नगरपालिकाको कार्यालय बागलुङ

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

पाना नं. १

क्र.स	लगाणीका क्षेत्र	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	इकाई	कुल बजेट	प्रथम चौमसिक सम्मको भौतिक		प्रथम चौमसिक सम्मको वित्तीय		कैफियत
					वषम	प्रगति	बजेट	खर्च	
१	भवन	१. कुँडुले उच्च मा.वि. भवन निर्माण	गोटा	१००.००१	१००	१००	१०००.००	६३६.७३	
		२							
		३							
२	सडक	जम्मा					१०००.००	६३६.७३	
		१. भिमसेनथान देखि थ्यारेक पश्चिम गेटसम्म सडक स्तरान्ताती	कि.मि.	२०९.८.८७०	२.६००	१००	२०९.८.८७०	२०९.८.८७०	
		२. शिवधाराचोक देखि मार्डकुटीसम्म सडक निर्माण	कि.मि.	५११.९३२	०.२६५	१००	५११.९३२	५११.९३२	
३	पार्क निर्माण	३. रात्माटा - कलिमाटी ग्रामिण सडक मर्मत सुधार	कि.मि.	१३७.५००	२.०००	१००	१३७.५००	१३७.५०	
		४. कलिमाटी - पैरावारी सडक मर्मत सुधार	कि.मि.	२०.०००	०.५००	१००	२०.०००	२०.००	
		५. देउरालिचोक - खहरे सडक मर्मत सुधार	कि.मि.	१६.७९८	०.५००	१००	१६.७९८	१६.७९८	
४	नाली निर्माण	६. देउरालीचोक - खहरे सडक मर्मत सुधार	कि.मि.	३०.७९३	०.५००	१००	३०.७९३	३०.७९३	
		७. देउरालीचोक - खहरे सडक मर्मत सुधार	कि.मि.	२१.०००	०.५००	१००	२१.०००	२१.०००	
		जम्मा					२८३६.८१३	२८३६.८१३	
५	जम्मा	१. उद्यानमा कम्पाउण्ड बाल निर्माण	गोटा	५०.०००	१	१००	५०.०००	५०.०००	
		२							
		जम्मा					५०.०००	५०.०००	
६	जम्मा	१. शिवधाराचोक देखि मुश्लीम बस्तीसम्म नाली मर्मत	कि.मि.	७०.०००	०.१००	१००	७०.०००	७०.०००	
		२							
		जम्मा					७०.०००	७०.०००	

311

इन्जिनियर

२०७३

२०७३

५	नाली सरसफाई नियमित	१. नगर क्षेत्रमा नियमित नाली सर - सफाई गर्ने कार्य	काम	७००.०००	१.०००	१००	२६८.५३६	२६८.८३६	
		२. ल्याण्डफिल्ड साईट फोहर व्यवस्थापन चालु खर्च	काम	४१.९२४	१.०००	१००	४१.९२४	४१.९२४	
		जम्मा							
६	शौचालय	१. सार्वजनिक शौचालयमा खानेपानी जडान	काम	६४.६३२	१.०००	१००	३१०.४६०	३१०.७६०	
		२. चालु खर्च					६४.६३२	६४.६३२	
		जम्मा					६४.६३२	६४.६३२	
		प्रगति (% मा) (Overall progress)							
७	ग्राभेल	१. विभिन्न वडाका सडकमा ग्राभेल राख्ने कार्य	कि.मि.	१०४.५२०	०.३६८	१००	१०४.५२०	१०४.५२०	
		२. चालु खर्च							
		जम्मा					१०४.५२०	१०४.५२०	
		प्रगति (% मा) (Overall progress)							
८	खानेपानी	१. विभिन्न वडाका खानेपानीका पाइप वितरण	कि.मि.	५६४.८१२	२.११०	१००	५६४.८१२	५६४.८१२	
		२. चालु खर्च							
		जम्मा					५६४.८१२	५६४.८१२	
		प्रगति (% मा) (Overall progress)							

3/11

सि. नं. १०५४
इन्जिनियर

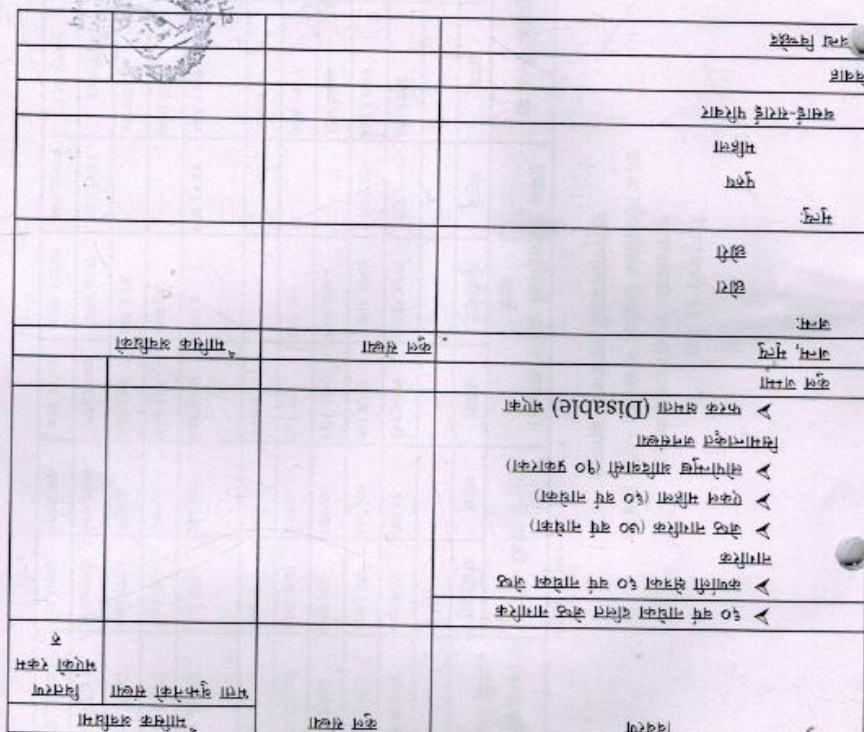


कार्यकारी अधिकृत

90

ईतिहास

১৯৮৮ সালের ১৯/০৮/৮৮
 ১৯৮৮ সালের ১৯/০৮/৮৮

[illegible]

अनुसूची १३ (घ)
कार्याधिकारी २० (१) सँग सम्बन्धित
प्रथम चौमासिक निकास र खर्चको प्रगति विवरण
नगरपालिकाको कार्यालय, धनकुटा

क्र.सं.	श्रोत	प्रथम चौमासिक अवधि सम्मको निकास			प्रथम चौमासिक अवधि सम्मको खर्च			बाँकी		जिम्मेवारी संरको रकम	क्रमगतको योजनाको खर्च		यस चौमासिक सम्मको
		चालु	पूर्वगत	जम्मा	चालु	पूर्वगत	जम्मा	चालु	पूर्वगत		चालु	पूर्वगत	
१	केन्द्रीय अनुदान												
२	निशर्त	१७४.०००	३३५६.३३३	४१३०.३३३	१८११.२२९	२९९४.९४३	४००६.१७४	-१७.२२१	१९९१.३८०	१९४४.१४९	०.०००	०.०००	
३	सशर्त	१९७२.३३३	११८८७.२००	१२०८४.५३३	४८२४.०७१	६६६०.९७१	३३३६.९७१	३३३६.९७१	६०६४.९७१	६३९८.४६२	०.०००	०.०००	
४	वैदेशिक अनुदान		४४२०.४९४	४४२०.४९४	४८२६.८४२	४८२६.८४२	४८२६.८४२	०.०००	-३३६.३४७	-३३६.३४७	०.०००	०.०००	
५	अन्य अनुदान	०.०००	४३४२.०००	४३४२.०००		४११.९७९	४११.९७९	०.०००	३८३०.०२८	३८३०.०२८	०.०००	०.०००	
६	आन्तरिक आय			०.०००			०.०००	०.०००	०.०००	०.०००			
क)	(कर, दरगु, शुल्क, बिक्री आदिबाट)	२७४.४३३	०.०००	२७४.४३३	४८४९.३७७	०.०००	४८४९.३७७	४८४९.३७७	३८३१.२२८	-२०८६.८२३	०.०००	०.०००	
ख)	राजस्व बाडफाड	०.०००	०.०००	०.०००		६१३.००४	६१३.००४	०.०००	-६१३.००४	-६१३.००४	०.०००	०.०००	
ग)	अन्य	०.०००	६८६७.११८	६८६७.११८		३३४४.२३८	३३४४.२३८	०.०००	३४११.८८०	३४११.८८०	०.०००	०.०००	
	जम्मा	२७४.४३३	६८६७.११८	७१४१.५५१	४८४९.३७७	३३४४.२३८	८८०६.४९९	-२०८६.८२३	३८३१.२२८	३८३१.२२८	०.०००	०.०००	
	कुल जम्मा	२७४.४३३	७१४१.५५१	७४१६.००३	४८४९.३७७	३३४४.२३८	९०६६.४७६	-२०८६.८२३	३८३१.२२८	३८३१.२२८	०.०००	०.०००	

लेखापाल

कार्यकारी अधिकृत



कार्यकारी अधिकृत

भौतिक तथा वित्तिय प्रगति

अनुसूची १३ (ड)
नगरपालिकाको कार्यालय बागलुङ
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
कार्यविकीको ३० (१) संघ सम्बन्धित

क्र. अनुदान/गा.वि.स कोष	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	इकाई	प्रथम चौमासिकमा भएको भौतिक प्रगति	हाल सम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति				कैफि	
				लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति		अनुमान बजेट
क केन्द्रीय अनुदान स्थानीय विकास प्रणाली न.पा. अनुदान									
१ जग्गा कोष	१. कटुले उच्च मा.वि. भवन निर्माण २. शिवशाराचोक देखि मार्डिस्टीसम्म सडक निर्माण १५. विभिन्न बडामा खानेपानीको पाईप वितरण	गोटा कि.मि. कि.मि. कि.मि.	१.००० ०.२६५ २.११	१.००० ०.२६५ २.११	१.००० ०.२६५ २.११	१.००० ०.२६५ २.११	६३६७३.००० ५११९३३.००० ५६४८१२.००	६३६७३.००० ५११९३३.००० ५६४८१२.००	नयाँ क्रमागत नयाँ
२ सडक बोर्ड नेपाल	१. भिमसेनबल देखि व्यारेक पश्चिम गेटसम्म सडक स्तरोन्नती	कि.मि.	२.६००	२.६००	२.६००	२.६००	२०९८८७.०००	२०९८८७.०००	क्रमागत
३ राजश्व वाडफोर्ड	१. उद्यान कम्पाउण्ड बाल निर्माण २. सावजनिक शौचालयमा खानेपानी बडान	गोटा काम काम	१.००० १	१.००० १	१.००० १	१.००० १	५००००.०० ६४६३२.००	५००००.०० ६४६३२.००	नयाँ नयाँ
५ स्था.वि. शुल्क	१. नगरक्षेत्रमा नियमित गाली सर - सफाई गर्ने कार्य २. ल्याण्डफिल्ड साईट फोहोर व्यवस्थापन	काम काम	१ १	१ १	१ १	१ १	२६८८३६.०० ४१९२४.००	२६८८३६.०० ४१९२४.००	क्रमागत क्रमागत
४ मर्मत संभार कोष	१. रास्माटा - कालिमाटी ग्रामिण सडक मर्मत सुधार २. कालिमाटी - पुरावारी सडक मर्मत सुधार ३. देउरालीचोक - खहरे सडक मर्मत सुधार ४. देउरालीचोक - खहरे सडक मर्मत सुधार ५. देउरालीचोक - खहरे सडक मर्मत सुधार ६. शिवशाराचोक देखि मुश्वीम बस्तीमा गाली मर्मत ७. विभिन्न बडका सडकमा ग्राभेल राख्ने कार्य ८. विभिन्न बडामा खानेपानीको पाईप वितरण	कि.मि. कि.मि. कि.मि. कि.मि. कि.मि. कि.मि. कि.मि. कि.मि.	२.००० ०.५०० ०.५०० ०.५०० ०.५०० ०.१०० ०.२६८ २.११	२.००० ०.५०० ०.५०० ०.५०० ०.५०० ०.१०० ०.२६८ २.११	२.००० ०.५०० ०.५०० ०.५०० ०.५०० ०.१०० ०.२६८ २.११	२.००० ०.५०० ०.५०० ०.५०० ०.५०० ०.१०० ०.२६८ २.११	१३७५०.०० २००००.०० १६७९८.०० ३०९३.०० ३०९३.०० ७००००.०० १०४४२०.०० ५६४८१२.००	१३७५०.०० २००००.०० १६७९८.०० ३०९३.०० ३०९३.०० ७००००.०० १०४४२०.०० ५६४८१२.००	क्रमागत क्रमागत क्रमागत क्रमागत क्रमागत क्रमागत क्रमागत क्रमागत
जम्मा रु.							२६१७२८.००	२६१७२८.००	

डिजिटल

कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १३ (क)
कार्यालयिको ३० (१) सँग सम्बन्धित
नगरपालिकाको कार्यालय बागलुङ

आ व ०७२/७३

विराट बर्यको बाँकी रकम र फछौट हुन बाँकी पेशकी सम्बन्धी विवरण

रकम रु. हजारमा

आ व ०७२/७३

विराट बर्यको बाँकी रकम र फछ्याँट हुन बाँकी पेशका संख्या/वर्ष

विराट बर्यहरूको

क्र.सं.	श्रोत	बाँकी रकम	चालु आ.व.को प्रथम चौमासिक सम्मको खर्च	बाँकी रकम	बाँकी पेस्की	चालु आ.व.को प्रथम चौमासिक सम्मको फछ्याँट		बाँकी पेस्की	
						रकम	प्रतिशत		
क)	केन्द्रीय अनुदान	२०६२.२५०	१५०.०००	१९१२.२५०	१९१२.२५०	१५०.०००	७.२७४	१९१२.२५०	
१	निशित अनुदान	२४२२.००८	९१.१४२	२३३०.८६६	२३३०.८६६	९१.१४२	३.७६३	२३३०.८६६	
२	सशर्त अनुदान	१०६७९.२९६	७०३.२७६	९९७६.०२०	९९७६.०२०	७०३.२७६	६.५८५	९९७६.०२०	
३	आयोजना, कार्यक्रम वजेट			०.०००			०.०००		
४	अन्य						६.२२८	१४२१९.१३७	
५	जम्मा	१५१६३.५४४	९४४.४१७	१४२१९.१३७	१४२१९.१३७	९४४.४१७	०.०००		
ख)	सरकारी गिदरकारी ररा निर्माण भवनबाट प्राप्त			०.०००			०.०००		
६	अनुदान	०.०००		०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	
७	कार्यक्रम	०.०००		०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	
८	जम्मा	०.०००		०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	
ग)	आन्तरिक आग			०.०००					
९	आन्तरिक आग (कर, दरम, शुल्क, विन्दी आदिबाट)	४५३.२८३	३५.०००	४१८.२८३	४१८.२८३	३५.०००	७.७२१	४१८.२८३	
१०	राजश्व बाँडफाँड	९०.०००		९०.०००	९०.०००	०.०००	०.०००	९०.०००	
११	नगरको सार्वजनिक सेवा आगमा विनियोजी सरी			०.०००			०.०००		
१२	अन्य						०.०००		
१३	जम्मा	४४३.२८३	३५.०००	४०८.२८३	४०८.२८३	३५.०००	६.४४३	४०८.२८३	
१४	कुल जम्मा (५+८+१३)	१५७०६.८३७	९७९.४१७	१४७२७.४२०	१४७२७.४२०	९७९.४१७	६.२३६	१४७२७.४२०	

कार्यकारी अधिकृत

रकम

लेखापाल

कार्यकारी अधिकृत

कार्यकारी अधिकृत
